WMR
WMR Rinsumageest b.v.

- Grond- Weg- en Waterbouw
- Milieutechniek
- Slooptechniek
- Asbestsanering

WMR
Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
tel. 0511-425050

Project : **220510 - Reconstructie wegen en rioleringen te Ferwert**
Opdrachtgever : **Gemeente Noardeast-Fryslân**
Directie : **Gemeente Noardeast-Fryslân**
Bestekkr. : **NE - 2021 - 21 / 220510**

Definitief

opstelldatum: 10-10-2022
laatst gewijzigd: 15-03-2022
o.b.v. werkbare werkdagen geen rekening houdend met onwerkbaar weer.
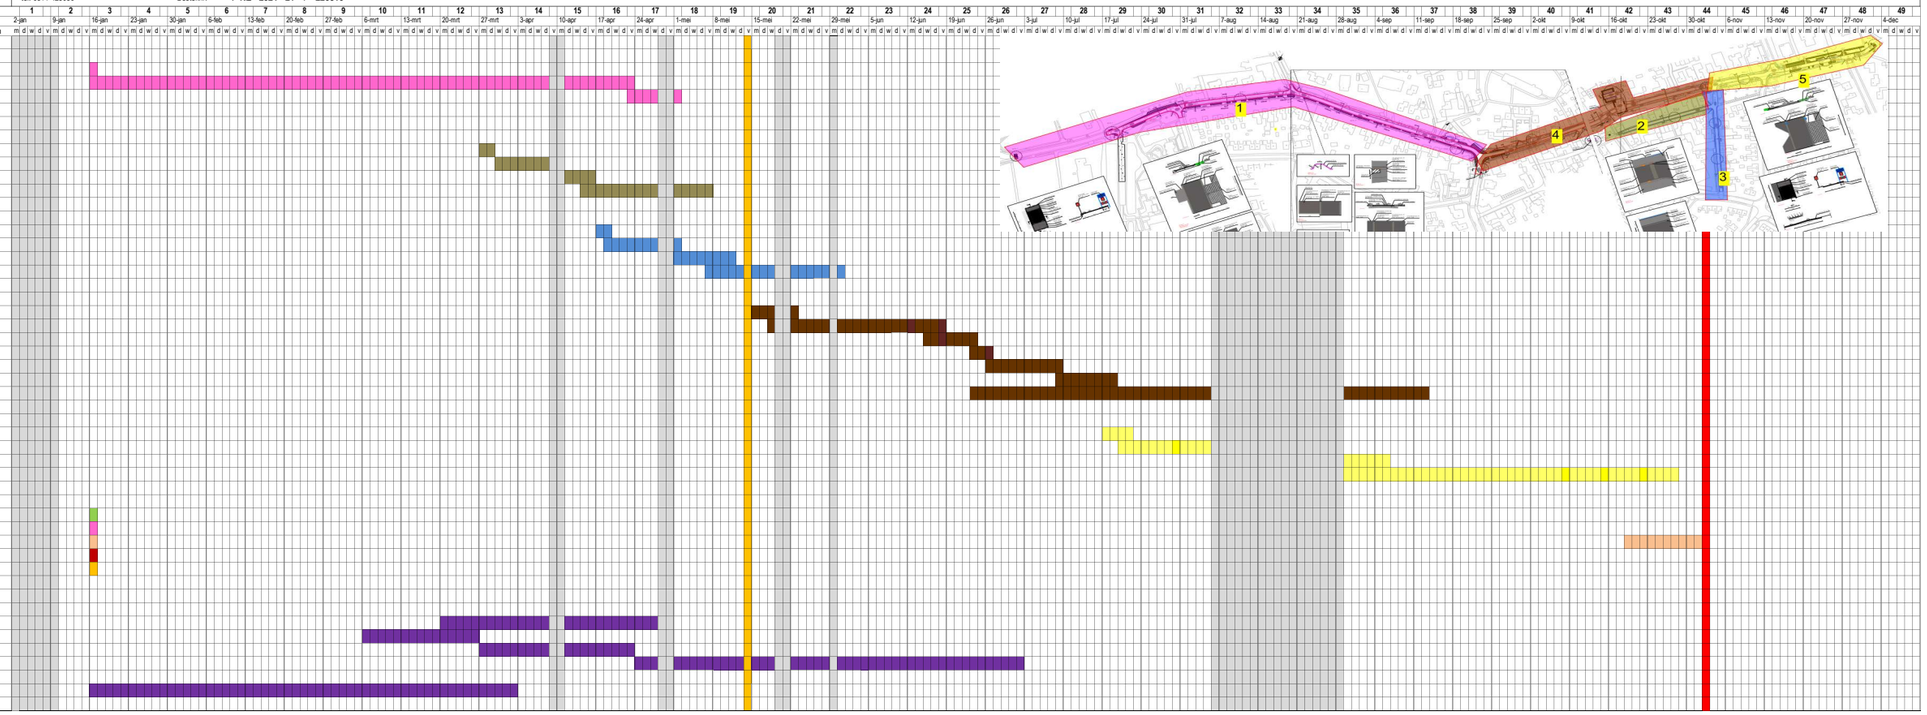
	weeknr. / week van / eh	
FASE 1 MARRUMERWEI (west naar oost)		
Rooien groen		
Opruimwerk en aanbrengen verhardingen	5550	
Buffer i.v.m. onwerkbare dagen		
Start fase 1 afhankelijk van werkzaamheden Delta		
FASE 2 NIJE BUORREN		
Opruimen verhardingen		
Rioolwerkzaamheden	115	
Cunetten en kolken		
Straatwerken	1150	
FASE 3 DE STREEK		
Opruimen verhardingen		
Rioolwerkzaamheden	130	
Cunetten en kolken		
Straatwerken	1300	
FASE 4 HOOFDSTRAAT (west naar oost)		
Opruimen verhardingen		
Rioolwerkzaamheden tot aan Reinderslaan	215	
Cunetten en kolken		
Opruimen verhardingen		
Rioolwerkzaamheden vanaf Reinderslaan	120	
Cunetten en kolken		
Straatwerken	4150	
FASE 5 ELINGAWEI (west naar oost)		
Opruimen verhardingen		
Rioolwerkzaamheden	200	
Cunetten en kolken		
Straatwerken	3500	
ALGEMEEN		
Inrichten werkterrein		
Verkeersvoorzieningen plaatsen (doorlopend!)		
Opruimen werkterrein		
Besteksmatige oplevering; 1 november		
Nacht fan Ferwert		
NB; Archeologische begeleiding!!		
DERDEN		
Sloop Dockinga College (WMR)		
Nutswerkzaamheden Vitens Nije Buorren		
Nutswerkzaamheden Vitens De Streek		
Nutswerkzaamheden Vitens Elingawei		
Nutswerkzaamheden Stedin/WMR		
Nutswerkzaamheden Delta (start Marrumerweg)
